




堰堤掘削・残土搬出



堰堤掘削

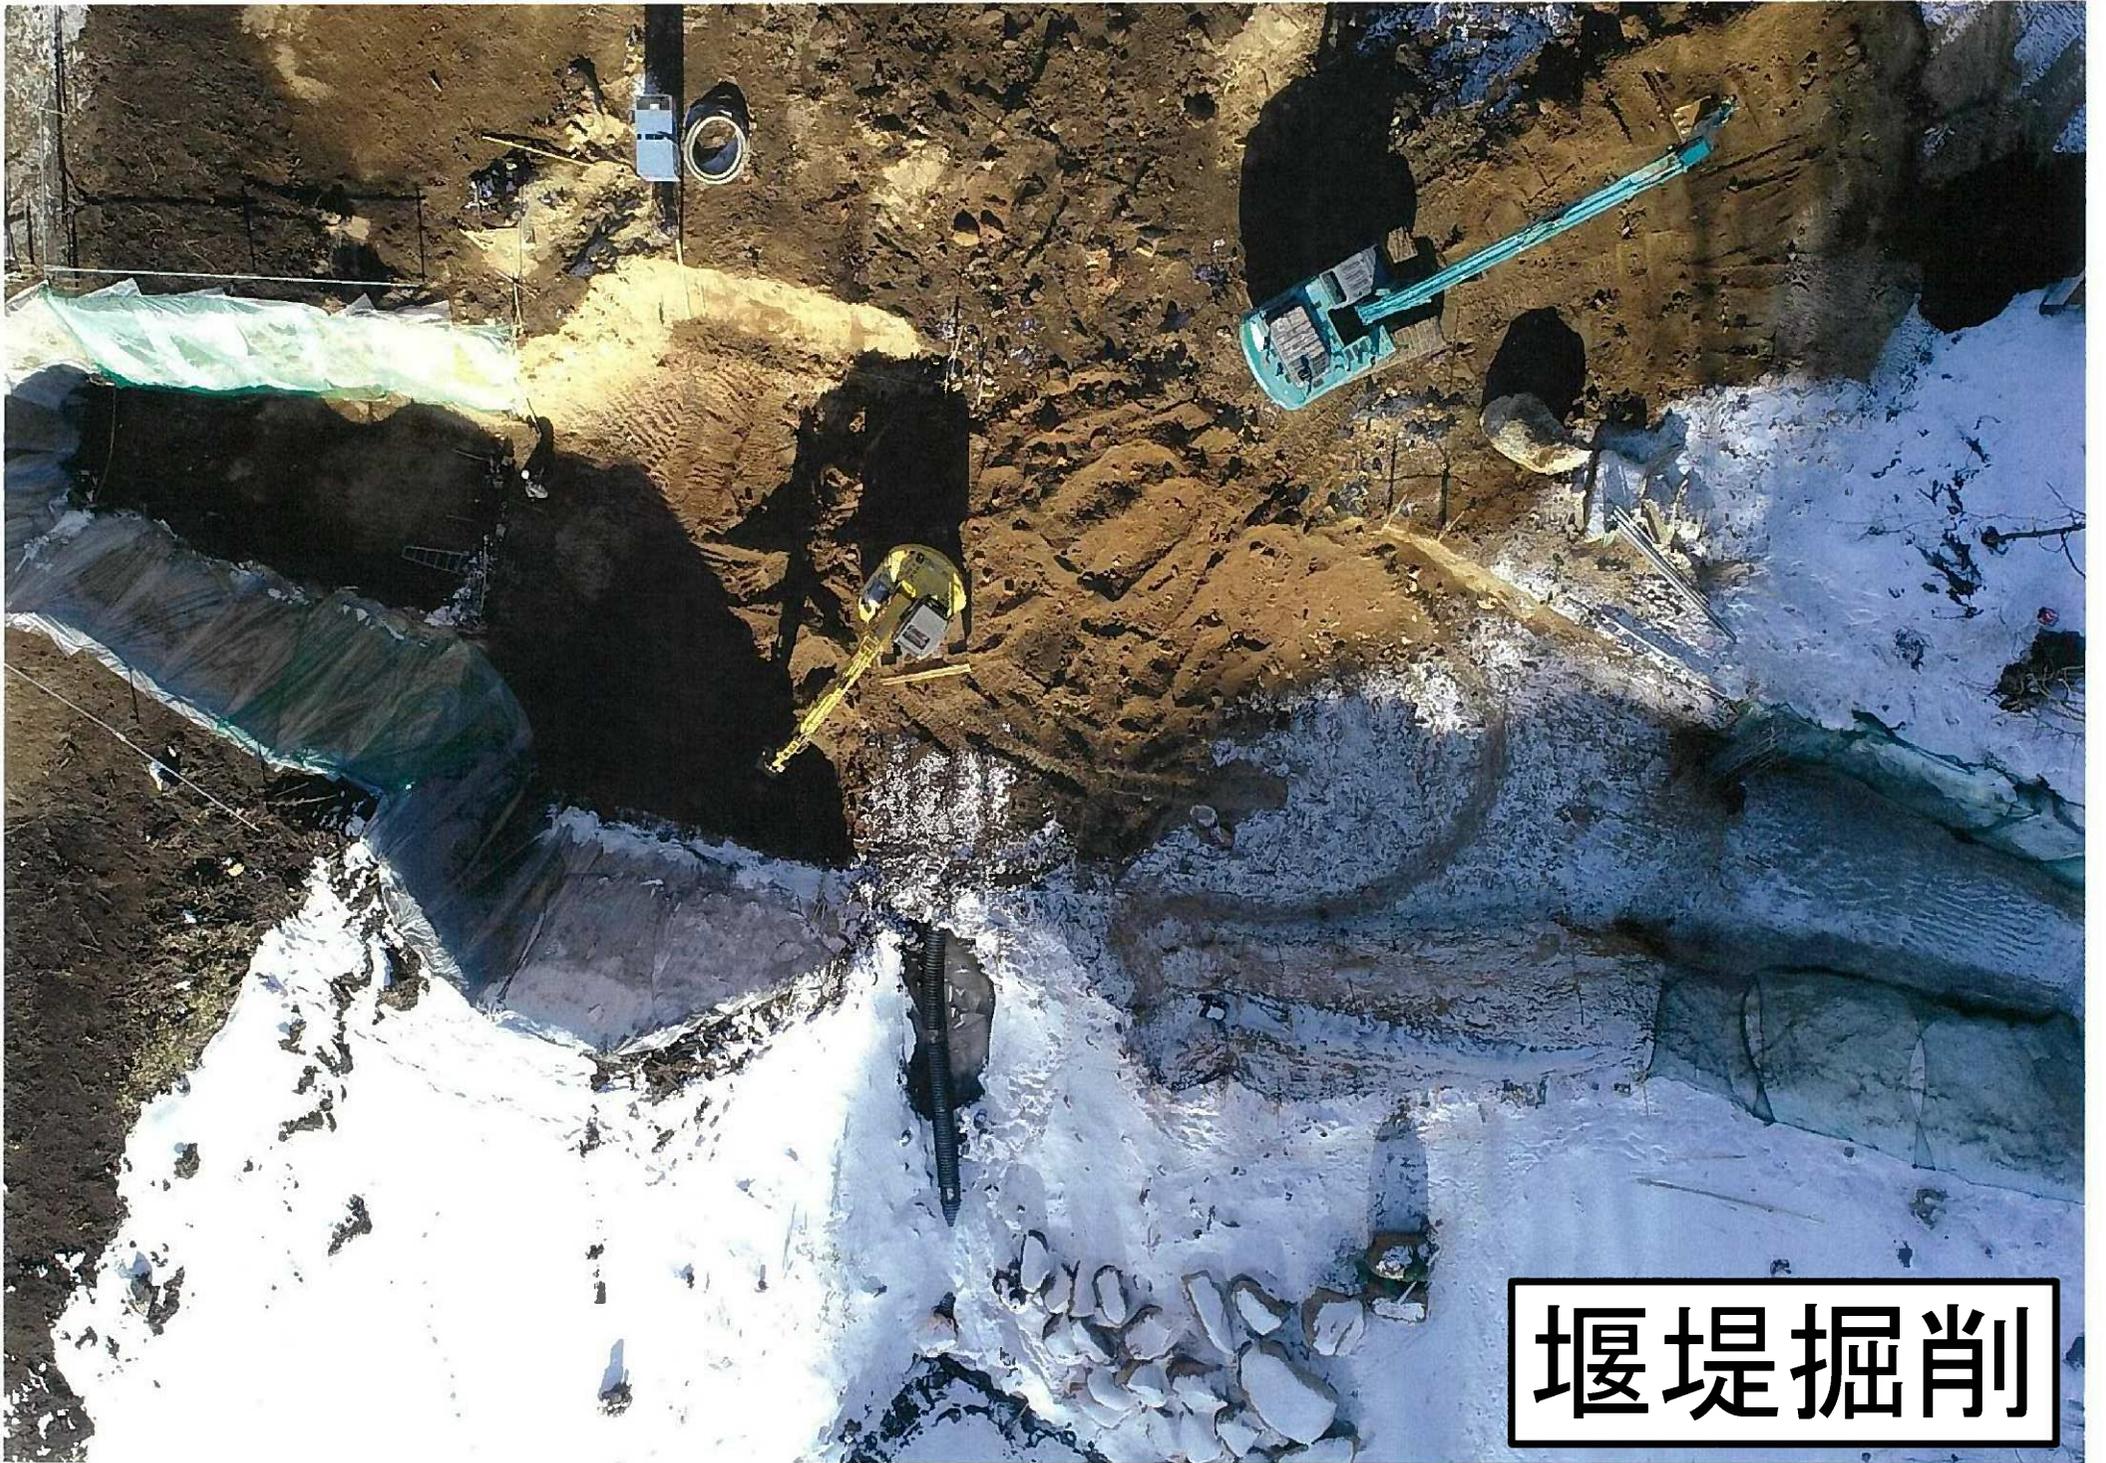

土捨て場の現況

岩手県知事（公所長）あて

受注者 住所 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番地の1  
氏名 佐藤建設株式会社  
工藤 卓

## 工 事 履 行 報 告 書

|          |                           |        |     |
|----------|---------------------------|--------|-----|
| 工 事 名    | 小バタケ沢筋日蔭地区砂防堰堤(その1)工事     |        |     |
| 工事場所     | 岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭地内           |        |     |
| 工 期      | 令和 7年 7月17日 ~ 令和 9年 5月12日 |        |     |
| 日 付      | 令和 8年 1月30日 ( 1 月分)       |        |     |
| 月 別      | 予定工程 %<br>( ) は工程変更後      | 実施工程 % | 備 考 |
| 令和 7年 7月 | 1.6                       | 1.6    |     |
| 令和 7年 8月 | 3.2                       | 3.2    |     |
| 令和 7年 9月 | 5.6                       | 5.6    |     |
| 令和 7年10月 | 7.2                       | 7.2    |     |
| 令和 7年11月 | 9.3                       | 9.3    |     |
| 令和 7年12月 | 11.1                      | 11.1   |     |
| 令和 8年 1月 | 13.3                      | 13.3   |     |
| 令和 8年 2月 | 15.3                      |        |     |
| 令和 8年 3月 | 25.1                      |        |     |
| 令和 8年 4月 | 31.8                      |        |     |
| 令和 8年 5月 | 38.5                      |        |     |
| 令和 8年 6月 | 45.9                      |        |     |
| 令和 8年 7月 | 52.5                      |        |     |
| 令和 8年 8月 | 57.8                      |        |     |
| 令和 8年 9月 | 64.0                      |        |     |
| (記事欄)    |                           |        |     |

|            |            |       |            |
|------------|------------|-------|------------|
| 総 括<br>監督員 | 主 任<br>監督員 | 監 督 員 | 現 場<br>技術員 |
|            |            |       | 千<br>葉     |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 現 場<br>代理人 | 主 任<br>(監 理)<br>技 術 者 |
| 工<br>藤     | 牧<br>原                |

岩手県知事（公所長）あて

受注者 住所 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番  
地の1  
氏名 佐藤建設株式会社  
工藤 卓

## 工 事 履 行 報 告 書

|          |                           |        |     |
|----------|---------------------------|--------|-----|
| 工 事 名    | 小バタケ沢筋日蔭地区砂防堰堤(その1)工事     |        |     |
| 工事場所     | 岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭地内           |        |     |
| 工 期      | 令和 7年 7月17日 ～ 令和 9年 5月12日 |        |     |
| 日 付      | 令和 8年 1月30日 ( 1 月分)       |        |     |
| 月 別      | 予定工程 %<br>( ) は工程変更後      | 実施工程 % | 備 考 |
| 令和 8年10月 | 71.1                      |        |     |
| 令和 8年11月 | 77.8                      |        |     |
| 令和 8年12月 | 82.7                      |        |     |
| 令和 9年 1月 | 87.1                      |        |     |
| 令和 9年 2月 | 91.0                      |        |     |
| 令和 9年 3月 | 94.1                      |        |     |
| 令和 9年 4月 | 99.0                      |        |     |
| 令和 9年 5月 | 100.0                     |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
|          |                           |        |     |
| (記事欄)    |                           |        |     |
