

岩手県知事（公所長）あて

受注者 住所 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番地
の1
氏名 佐藤建設株式会社
工藤 卓

工 事 履 行 報 告 書

工 事 名	小バタケ沢筋日蔭地区砂防堰堤(その1)工事		
工事場所	岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭地内		
工 期	令和 7年 7月17日 ～ 令和 9年 5月12日		
日 付	令和 8年 3月 2日 (2 月分)		
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和 7年 7月	1.6	1.6	
令和 7年 8月	3.2	3.2	
令和 7年 9月	5.6	5.6	
令和 7年10月	7.2	7.2	
令和 7年11月	9.3	9.3	
令和 7年12月	11.1	11.1	
令和 8年 1月	13.3	13.3	
令和 8年 2月	15.3	15.3	
令和 8年 3月	25.1		
令和 8年 4月	31.8		
令和 8年 5月	38.5		
令和 8年 6月	45.9		
令和 8年 7月	52.5		
令和 8年 8月	57.8		
令和 8年 9月	64.0		
(記事欄)			


総 括 監督員	主 任 監督員	監督員	現 場 技術員	現 場 代理人	主 任 (監 理) 技 術 者
			三 浦	工 藤	牧 原

岩手県知事（公所長）あて

受注者 住所 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番地の1
氏名 佐藤建設株式会社
工藤 卓

工 事 履 行 報 告 書

工 事 名	小バタケ沢筋日蔭地区砂防堰堤(その1)工事		
工事場所	岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭地内		
工 期	令和 7年 7月17日 ～ 令和 9年 5月12日		
日 付	令和 8年 3月 2日 (2 月分)		
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和 8年10月	71.1		
令和 8年11月	77.8		
令和 8年12月	82.7		
令和 9年 1月	87.1		
令和 9年 2月	91.0		
令和 9年 3月	94.1		
令和 9年 4月	99.0		
令和 9年 5月	100.0		
(記事欄)			

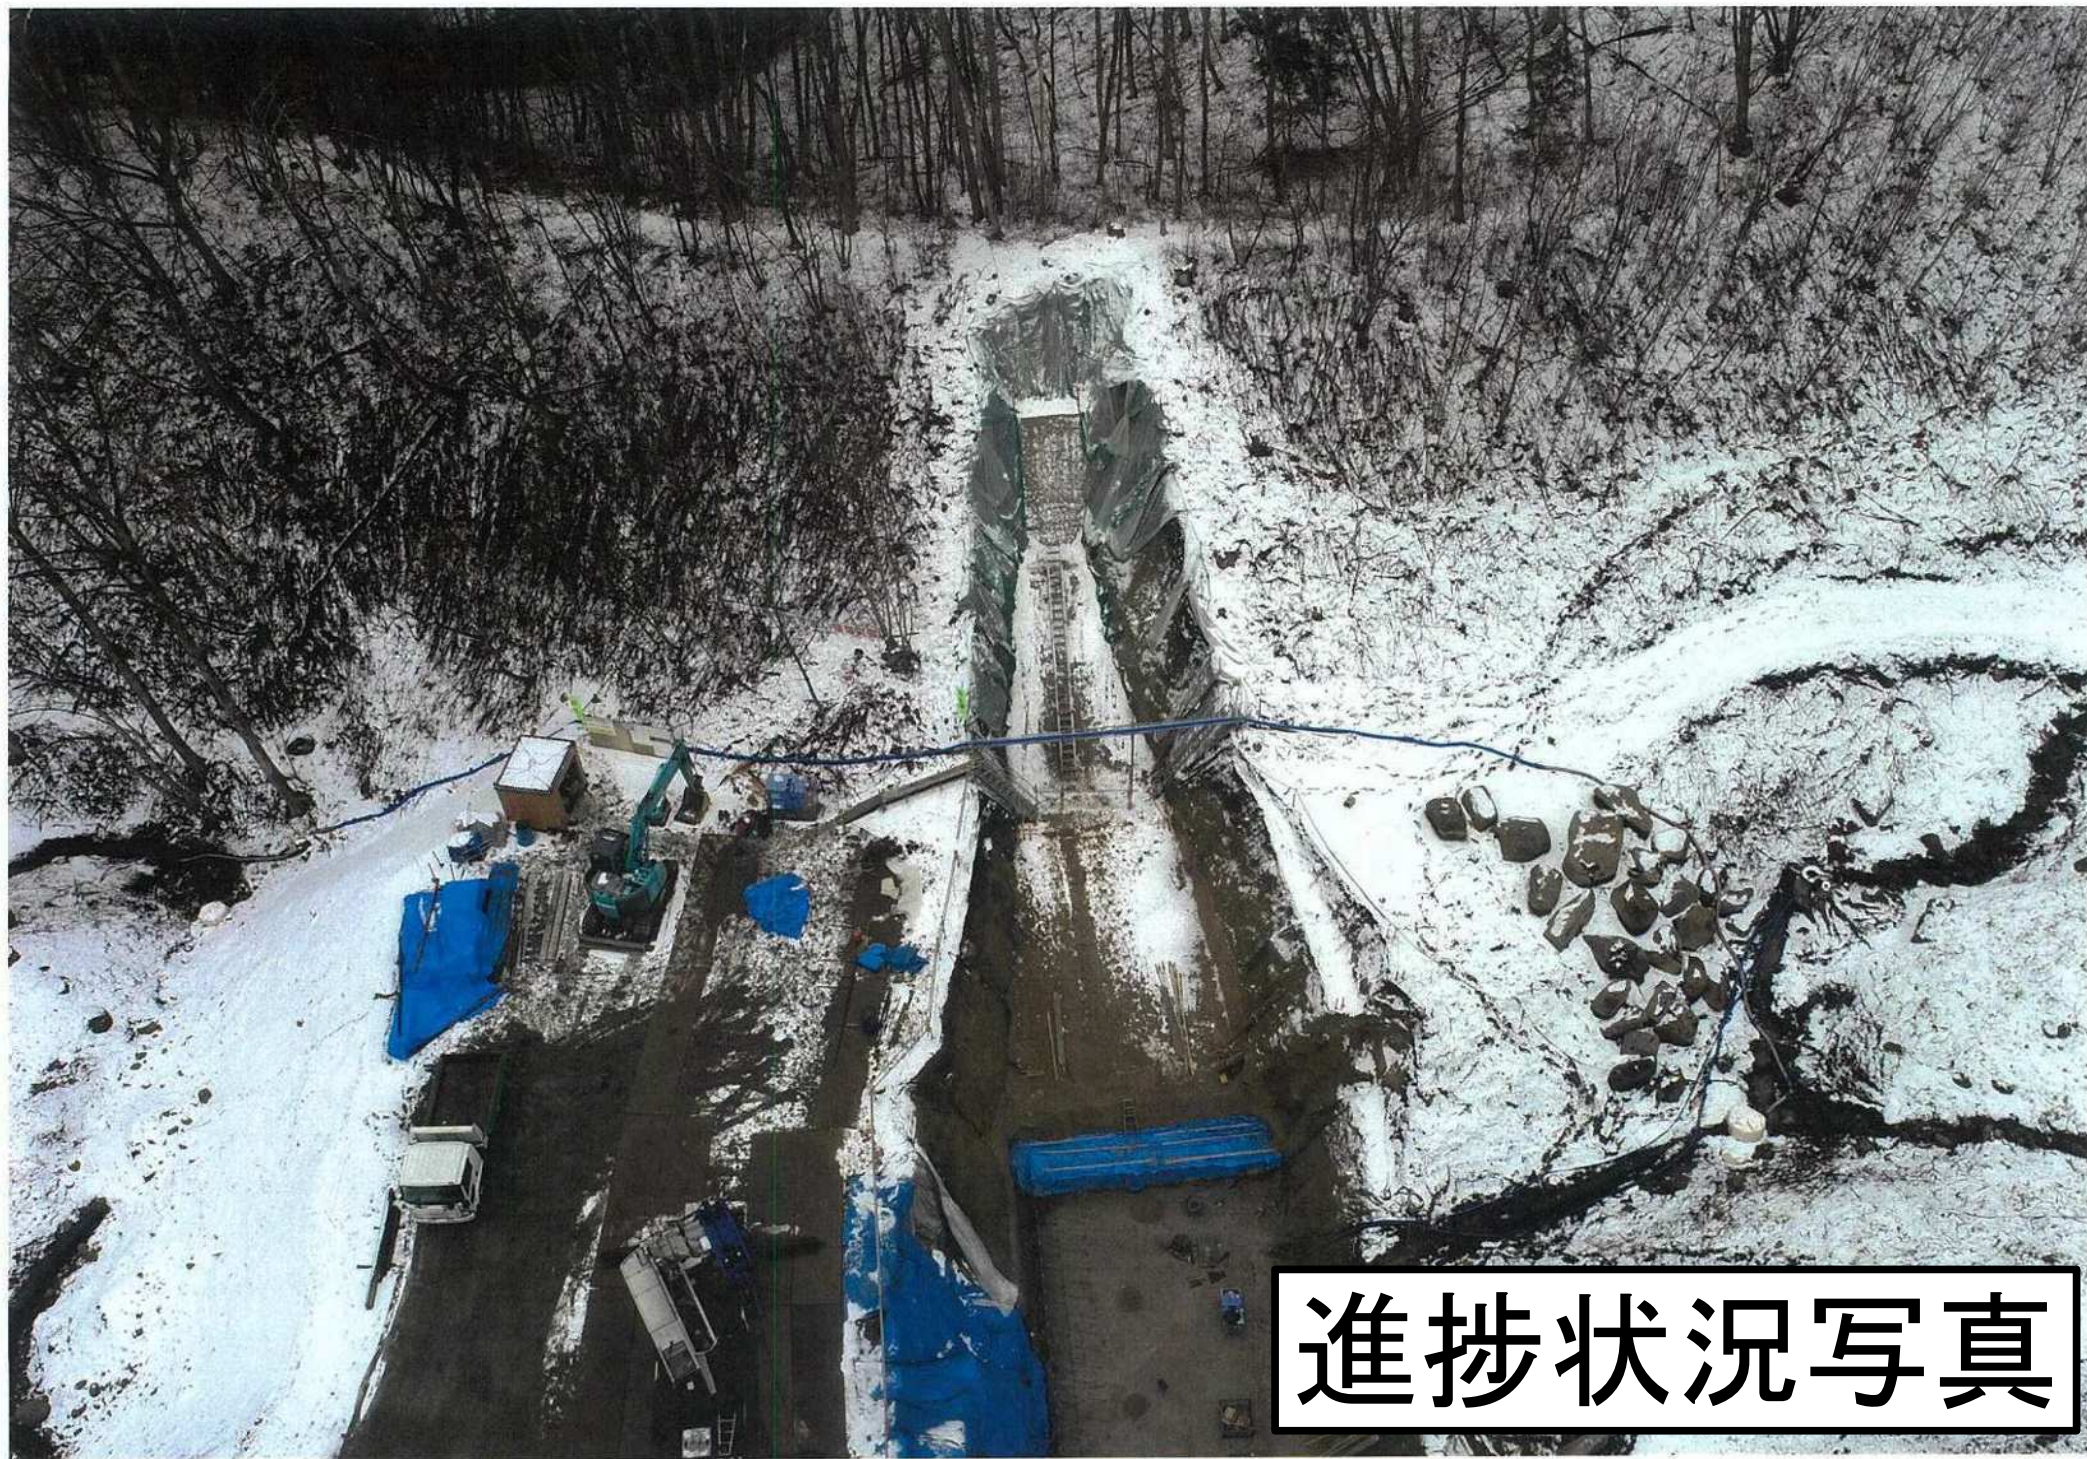

進捗状況写真



進捗状況写真
